SR530 Flooding and Mudslide

Period Highlight: 1

Plan | % Complete | % Complete (beyond plan)
Actual | Actual (beyond plan)

Last updated August 20, 2014
Note: units may be extended
Generally committed to end of month
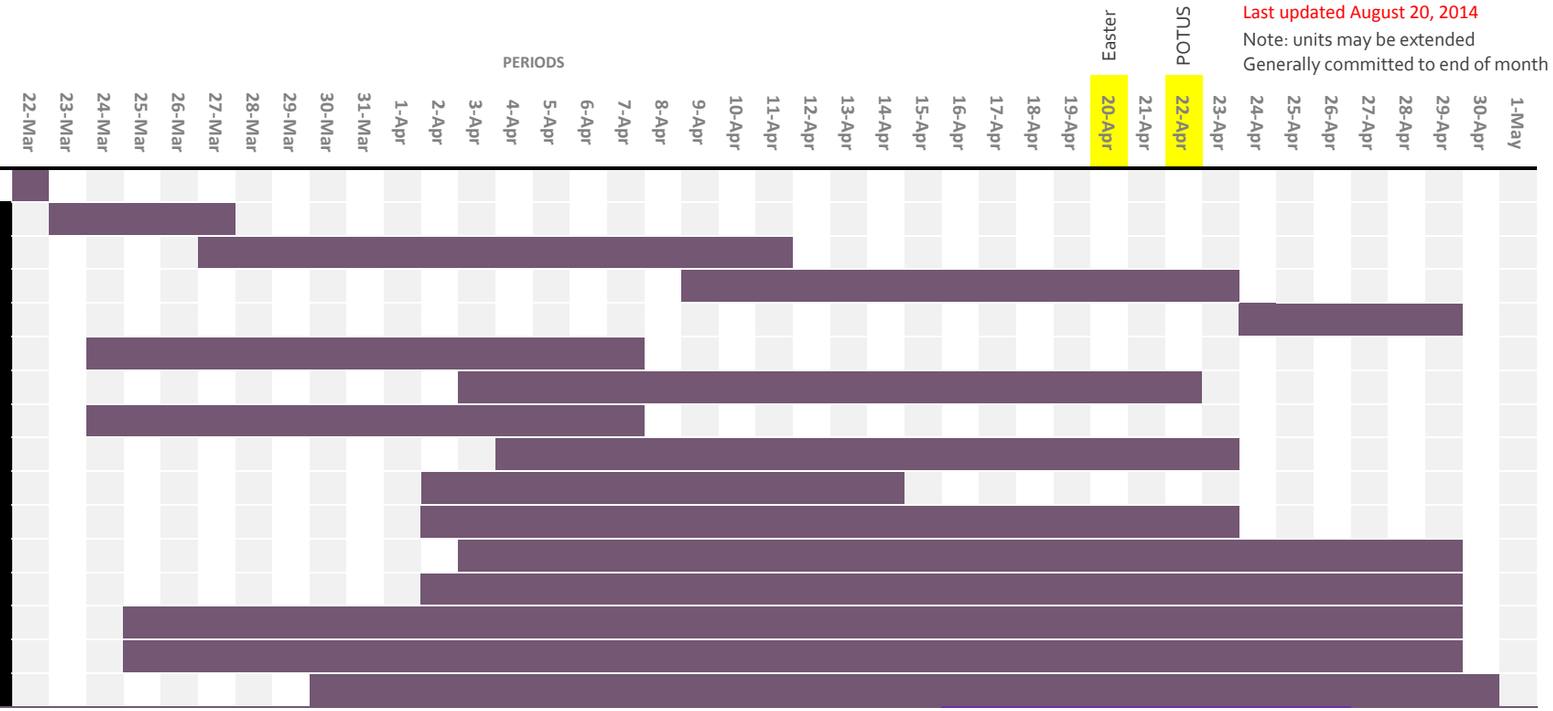
ACTIVITY	Plan Start	Dur	Actual Start	Dur	PERCENT COMPLETE
Mudslide	3/22	0	3/22	0	100%
NW IMT Type 3	3/23	5	3/23	5	100%
WA Team 4 Type 2	3/27	16	3/27	16	100%
WA Team 3 Type 2	4/9	15	4/9	15	100%
NW IMT Type 3	4/24	6	4/24	6	100%
White FEMA IST	3/24	15	3/24	15	100%
Blue FEMA IST	4/3	20	4/3	20	100%
WA TF-1 USAR Blue	3/24	15	3/24	15	100%
WA TF-1 USAR White	4/4	20	4/4	20	100%
CA TF7 USAR	4/2	13	4/2	13	100%
USAR Dog Teams (20)	4/2	22	4/2	22	100%
WA-NG Debris Mgt	4/3	27	4/3	27	100%
WA-NG Mobile Med	4/2	28	4/2	28	100%
WA-NG Air Spt	3/25	36	3/25	36	100%
WA-NG Fatality Search & Recover	3/25	36	3/25	36	100%
WA-NG Decon Team	3/30	32	3/30	32	100%
